



# ПРОЕКТ

«Совершенствование процесса организации одевания детей (4-5 лет) на прогулку в холодное время года»

МБДОУ № 223 «Детский сад общеразвивающего вида»  
Никифорова И.П., заведующий



**КУЗБАСС**  
время быть первыми

# Паспорт проекта


Управление образования Администрации г. Кемерово  
МБДОУ № 223 «Детский сад общеразвивающего вида»  
(наименование структурного подразделения)

## Паспорт лин-проекта

«Совершенствование процесса организации одевания детей (4-5 лет) на прогулку в холодное время года»  
(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления образования  
администрации г. Кемерово

 Н.Ю. Дашковская

### Общие данные:

Заказчик: Н.Ю. Дашковская – начальник управления образования администрации г. Кемерово

Процесс: одевание детей (4-5 лет) на прогулку в холодное время года .

Границы процесса: от момента выхода детей в приемную до момента выхода воспитанников на улицу.

Руководитель лин-проекта: заведующая – И.П. Никифорова

Команда лин-проекта: Н.В. Зарубина, М.А. Шмыгун, В.В. Ярошенко, А.В. Белозерова, А.В. Метальникова, А.А. Иванова.

### Обоснование:

1. Длительный процесс одевания детей на прогулку.
2. Отсутствие четкой организации при одевании воспитанников, дисциплины.

### Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени одевания воспитанников на прогулку в холодное время года (мин.)	18 мин.	10 мин.

### Эффекты:

Формирование у воспитанников и сотрудников правил и навыков быстрого одевания в холодное время года, с целью сохранения здоровья детей.

### Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта (22.10.2019г. – 25.10.2019г.).
2. Картирование текущего состояния (28.10.2019г. – 15.11.2019г.).
3. Анализ проблем и потерь (18.11.2019г. – 22.11.2019г.).
4. Составление карты целевого состояния (25.11.2019г. – 29.11.2019г.).
5. Разработка плана мероприятий (02.12.2019г. – 06.12.2019г.).
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (09.12.2019г. – 13.12.2019г.).
7. Внедрение улучшений (16.12.2019г. – 24.01.2020г.).
8. Мониторинг результатов (27.01.2020г. – 31.01.2020г.).
9. Закрытие проекта (03.02.2020г. – 07.02.2020г.).
10. Мониторинг достигнутых результатов (20.04.2020г. – 24.04.2020г.).

# Паспорт проекта

## Блок 1

### **Общие данные:**

Заказчик: Н.Ю. Дашковская – начальник управления образования администрации г. Кемерово

Процесс: одевание детей (4-5 лет) на прогулку в холодное время года .

Границы процесса: от момента выхода детей в приемную до момента выхода воспитанников на улицу.

Руководитель лин-проекта:

заведующая – И.П. Никифорова

Команда лин-проекта: Н.В. Зарубина, М.А. Шмыгун, В.В. Ярошенко, А.В. Белозерова, А.В. Метальникова, А.А. Иванова.

# Паспорт проекта

## Блок 2

### **Обоснование:**

1. Длительный процесс одевания детей на прогулку.
2. Отсутствие четкой организации при одевании воспитанников, дисциплины.

# Паспорт проекта

## Блок 3

### Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени одевания воспитанников на прогулку в холодное время года (мин.)	18 мин.	10 мин.

### Эффекты:

Формирование у воспитанников и сотрудников правил и навыков быстрого одевания в холодное время года, с целью сохранения здоровья детей.

# Паспорт проекта

## Блок 4

### **Сроки:**

1. Согласование паспорта лин-проекта (22.10.2019г. – 25.10.2019г.).
2. Картирование текущего состояния (28.10.2019г. – 15.11.2019г.).
3. Анализ проблем и потерь (18.11.2019г. – 22.11.2019г.).
4. Составление карты целевого состояния (25.11.2019г. – 29.11.2019г.).
5. Разработка плана мероприятий (02.12.2019г. – 06.12.2019г.).
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком (09.12.2019г. – 13.12.2019г.).
7. Внедрение улучшений (16.12.2019г. – 24.01.2020г.).
8. Мониторинг результатов (27.01.2020г. – 31.01.2020г.).
9. Закрытие проекта (03.02.2020г. – 07.02.2020г.).
10. Мониторинг достигнутых результатов (20.04.2020г. – 24.04.2020г.).


# Команда проекта



**Никифорова Ирина Павловна –  
заведующая – руководитель проекта**



**Зарубина Наталья Викторовна –  
старший воспитатель**



**Иванова Анна Александровна –  
ведущий консультант АНО «Центр  
компетенций Кемеровской области»**



**Метальникова Антонина  
Владимировна - воспитатель**



**Марина Александровна Шмыгун –  
учитель-логопед**



**Вероника Владимировна Ярошенко –  
воспитатель**



**Алла Витальевна Белозерова –  
воспитатель**

# Лист наблюдения


(таблица для проведения хронометража)

## 21 воспитанник

№ п/п	Выполнение мероприятий	Время	Общее количество времени (текущий показатель)
1.	Начало одевания	10.25	18 мин.
2.	Надевание колготок, кофт, теплых штанов, шапок, курток.	13 мин.	
3.	Дети берут обувь	1 мин.	
4.	Путь детей от приемной до холла детского сада	1 мин.	
5.	Обувание	2 мин.	
6.	Надевание перчаток, рукавиц	1 мин.	
7.	Момент выхода детей на улицу	10.43	




# Легенда проекта:



- Воспитанники ДОУ



- Воспитатель ДОУ



- Младший воспитатель ДОУ



- «Ёж»


# Работа команды над проектом



# Карта текущего состояния процесса

Совершенствование процесса организации одевания детей (4 – 5 лет) на прогулку в холодное время года


Д  
Е  
Г  
Е  
Н  
А

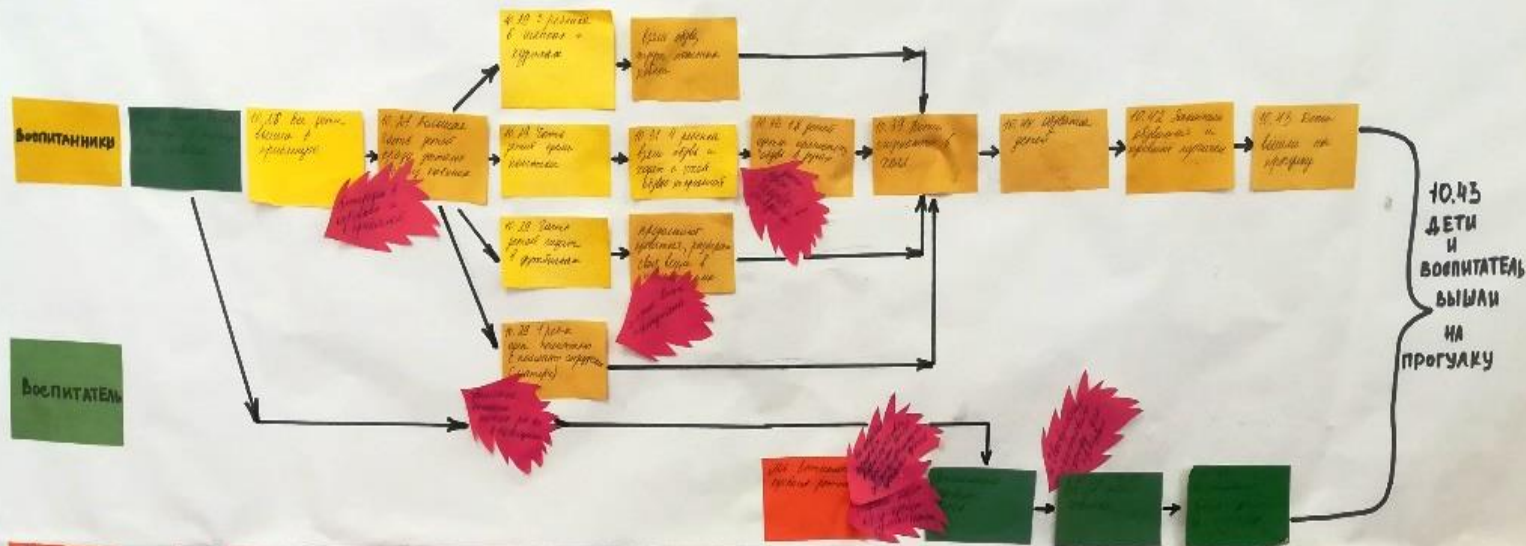


Е.ж.

ВПП – 18 минут

# Пирамида проблем

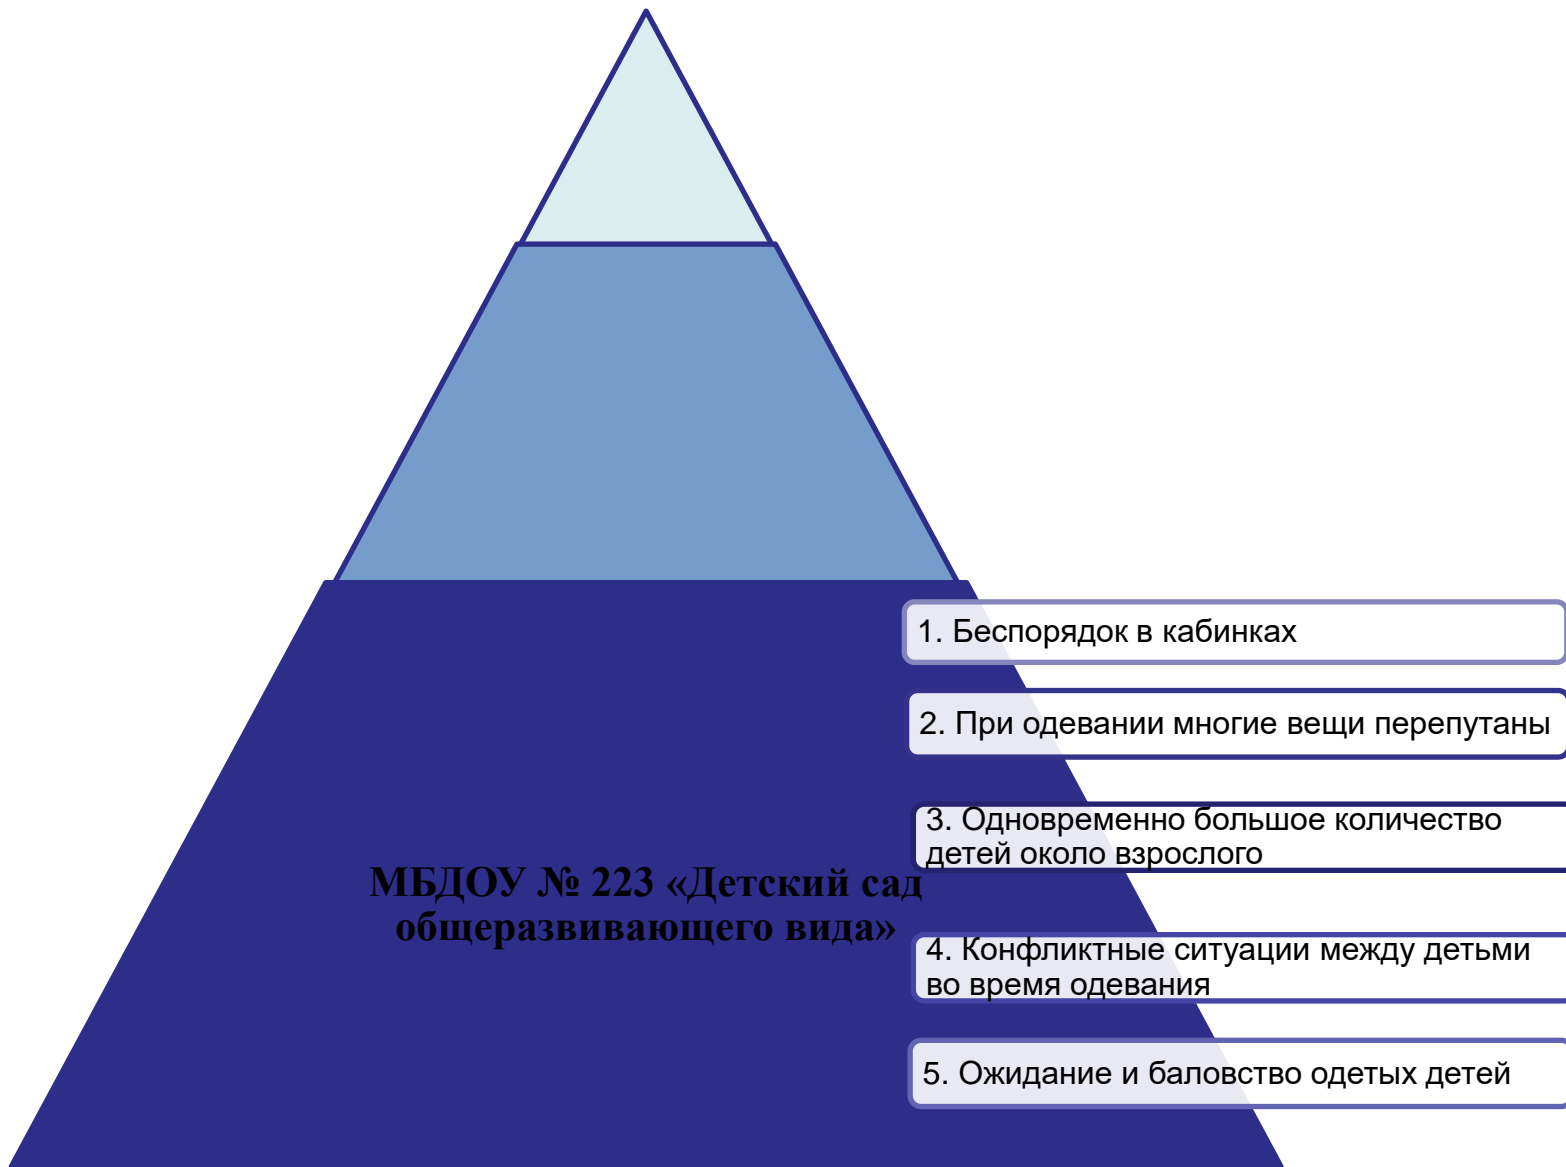

# Карта целевого состояния процесса

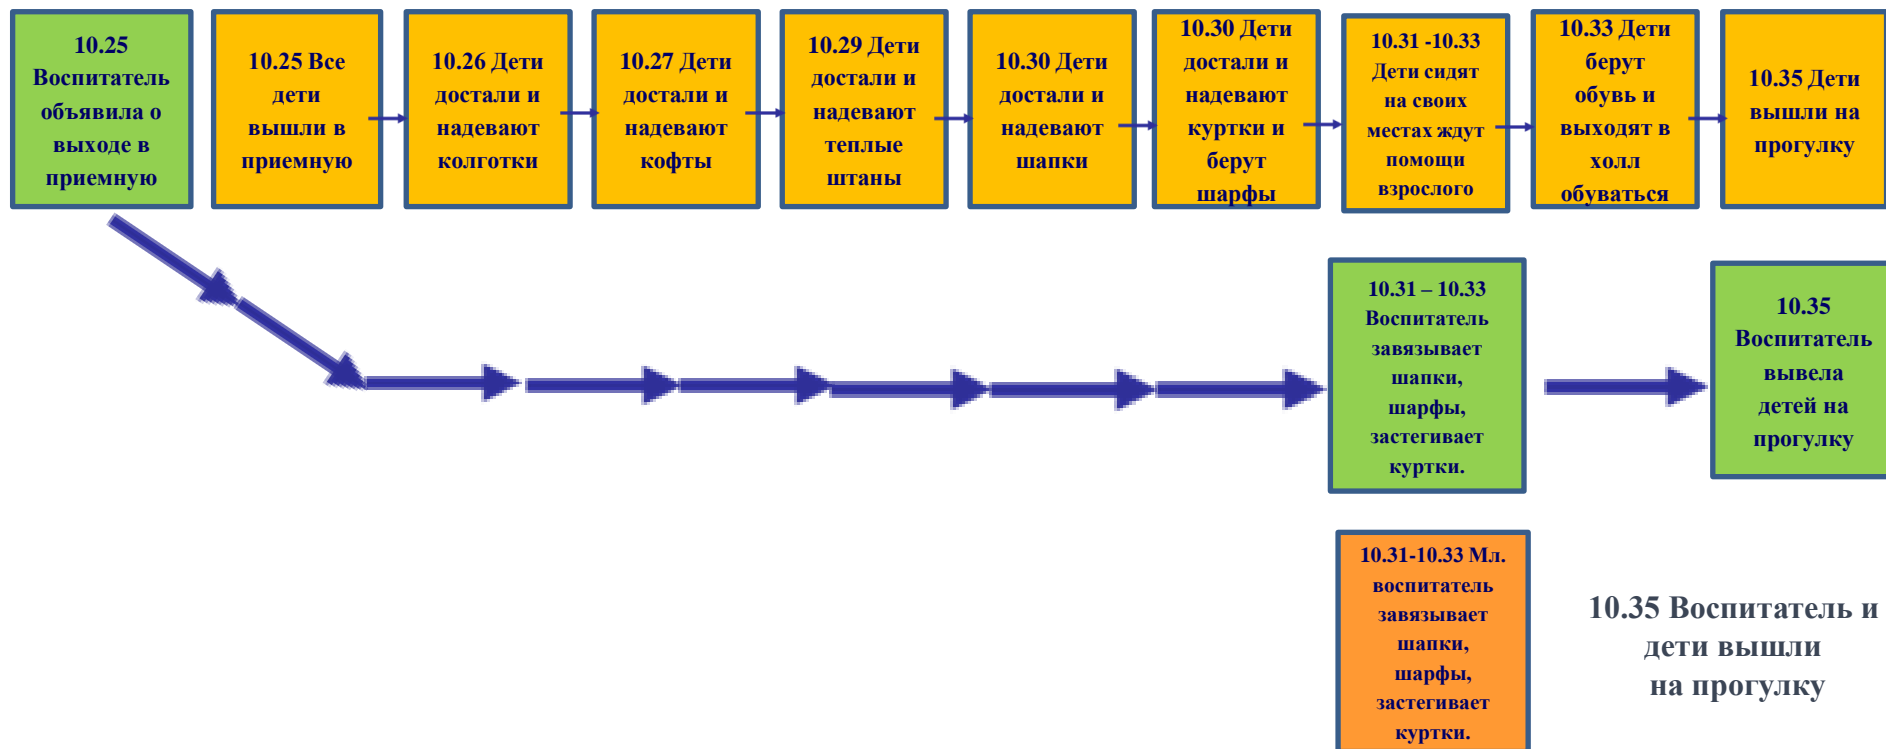

ВПП – 10 минут


# Анализ проблем (метод 5 почему)

№ п/п	Выявленные проблемы	Коренные причины
1	Беспорядок в кабинках	Отсутствуют мероприятия с родителями и детьми по правильному хранению и размещению вещей в кабинках.
2	При одевании все вещи перепутаны	Отсутствуют мероприятия по последовательному взятию вещей из кабинок детьми.
3.	Одновременно большое количество детей около взрослого	Не сформирован навык самостоятельного одевания у детей (обращаются за помощью ко взрослому)
4.	Конфликтные ситуации между детьми во время одевания	Возникают недовольства детей по разным причинам во время одевания
5.	Ожидание и баловство одетых детей	Отсутствует синхронное последовательное одевание

# План мероприятий по устранению проблем

№ п/п	Мероприятия	Ответственный	Сроки
1.	Разработать памятку хранения и размещения вещей в кабинке для детей и родителей	Воспитатель средней группы	02.12.19
2.	Освещение темы хранения и размещения вещей в кабинках на родительском собрании, группе ватсап, размещение консультативного материала в приемной. Размещение информации на официальном сайте ДОУ.	Воспитатель средней группы Ответственный по размещению информации на официальном сайте ДОУ	с 02.12.19 по 06.12.19
3.	Разработать алгоритм (памятка) последовательного одевания вещей для размещения в кабинках	Воспитатель средней группы	с 03.12.19 по 04.12.19
4.	Беседы с детьми о последовательности одевания на прогулку	Воспитатель средней группы	с 02.12.19 по 06.12.19
5.	Практическая деятельность последовательного взятия и одевания вещей из кабинок, согласно алгоритму одевания	Воспитатель средней группы	с 02.12.19 по 06.12.19
6.	Разработать инструкцию для педагога при одевании детей (визуализация), система канбан (соблюдение синхронности)	Старший воспитатель	с 03.12.19 по 06.12.19
7.	Разработать и ввести систему оценки поведения детей во время одевания от сказочного героя «Кота Одевашкина»	Воспитатель средней группы	с 05.12.19 по 06.12.19
8.	Разработать инструкцию по действиям воспитателя и младшего воспитателя во время одевания детей	Старший воспитателя	с 05.12.19 по 06.12.19

# Достиженные результаты

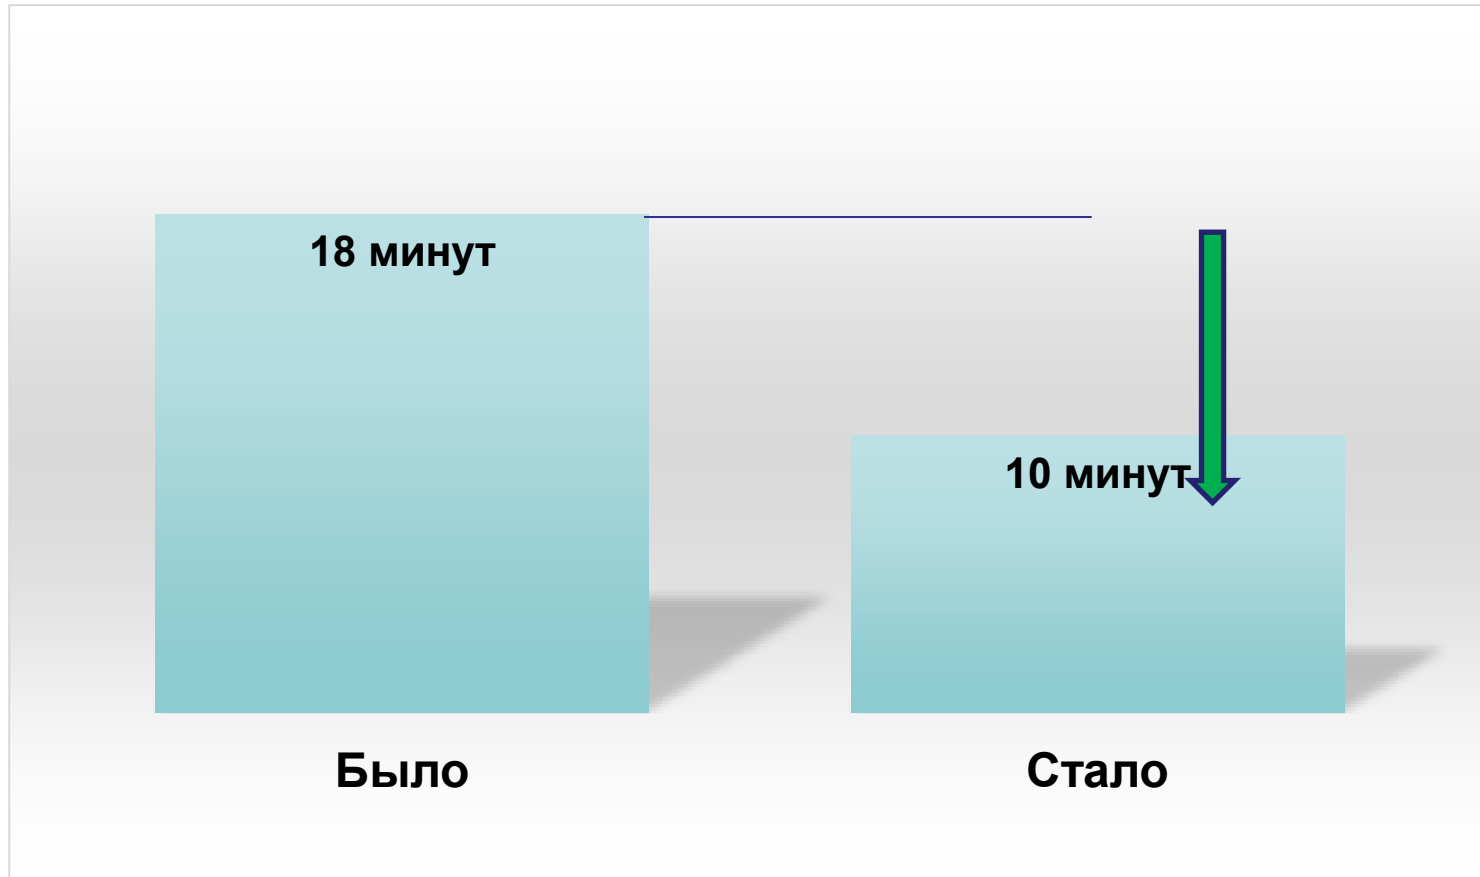




# «Было» – «Стало»

## 1. Беспорядок в кабинках



Отсутствуют мероприятия с родителями и детьми по правильному хранению и размещению вещей в кабинках.

Разработать памятку и рекомендации хранения и размещения вещей в кабинке для родителей



# «Было» – «Стало»

2. При одевании  
все вещи  
перепутаны



Отсутствуют мероприятия  
по последовательному  
взятию вещей из кабинок  
детьми.

Разработать алгоритм  
(памятка)  
последовательного взятия  
вещей для размещения в  
кабинках




# «Было» – «Стало»

3. Одновременно  
большое  
количество детей  
около взрослого

Не сформирован навык самостоятельного одевания у детей (обращаются за помощью к взрослому)

Разработать инструкцию по действиям воспитателя и младшего воспитателя во время одевания детей



# «Было» – «Стало»

4. Конфликтные ситуации между детьми



Возникают недовольства детей по разным причинам, во время одевания

Разработать и ввести систему оценки поведения детей во время одевания от сказочного героя «Кота Одевашкина»



# «Было» – «Стало»



5. Ожидание и баловство одетых детей

Отсутствует синхронное последовательное одевание

Разработать сигнальную систему в виде канбана (соблюдение синхронности) при одевании детей (визуализация)



# Разработанные стандарты по внедренным улучшениям





# Информационный стенд по проекту

Совершенствование процесса организации одевания детей (4 – 5 лет) на прогулку в холодное время года

## Карта текущего состояния



## Карта целевого состояния





---

# Спасибо за внимание!

**Наши контакты:**  
**650002, г. Кемерово,**  
**проспект Шахтеров, 85 Б,**  
**тел.64-80-55,**  
**[mdou223kemerovo@mail.ru](mailto:mdou223kemerovo@mail.ru)**

